

Cronograma Gerencial

Sistema Lousa Digital —
implantação em 45 dias

Sumário executivo

Visão consolidada do plano de implantação de 45 dias corridos, preparado para a reunião de apresentação à Diretoria do SINDESTIVA-PE em setembro de 2026.

1. Visão consolidada	PÁG. 3
2. Premissas do cronograma	PÁG. 4
3. Marcos com datas fixas	PÁG. 5
4. Visão Gantt — 7 sprints semanais	PÁG. 6
5. Recomendações finais & próximos passos	PÁG. 7

POR QUE ESTE DOCUMENTO

Este cronograma é o resumo executivo do **Plano de Implementação v1.0** (67KB, 16 seções, disponível na íntegra). Foi ajustado para a janela de **45 dias** solicitada pela Diretoria, com cortes de escopo conscientes e dedicação integral do sponsor técnico. O objetivo é apresentar, de forma visual e direta, **quando** o sistema fica pronto, **o que** é entregue em cada marco, e **quanto** custa.

Conteúdo deste documento

- **1. Visão consolidada** — datas, investimento, horas dedicadas
- **2. Premissas** — o que mudou em relação ao plano original de 18 semanas para caber em 45 dias
- **3. Marcos** — 5 entregas formais com datas fixas, validadores e critérios Go/No-Go
- **4. Visão Gantt** — diagrama visual de 7 sprints semanais com atividades paralelas

Para o plano completo (16 seções, WBS com 86 HUs, matriz de 15 riscos, orçamento detalhado, KPIs por trimestre, governança contratual), consulte o documento **SINDESTIVA-PE-PLANO-IMPLEMENTACAO-2026-09-01.md**.

01 · Visão consolidada

O plano em 1 página

O sistema Lousa Digital entra em operação em 45 dias corridos, com investimento de R\$ 2.805, dedicação integral do sponsor técnico e piloto de 1 fiscal no Porto de Suape.

Indicadores-chave do plano

DURAÇÃO 45 dias ~32 dias úteis 14/09 → 28/10/2026	INVESTIMENTO R\$ 2.805 Cash ano 1 infra + jurídico + viagem	HORAS TÉCNICAS 256h ~40h/sem · 100% exclusivo 7 sprints semanais	MARCOS 5 M0 a M4 Go-Live 28/10/26
--	--	---	--

Os 5 marcos na linha do tempo

MARCO	DATA	DIAS	ENTREGÁVEL	VALIDADOR
M0	18/09/2026 · sex	D+4	Kickoff, CCT obtida, advogado contratado, infra pronta	Josias + Paulo
M1	25/09/2026 · sex	D+11	Centro de Comando com Lousa oficial de Suape espelhada	Manoel Costa
M2	05/10/2026 · seg	D+21	Demo executiva — sistema completo (Lousa + Remanejamento + PWA + Auditoria)	Josias + Diretoria
M3	19/10/2026 · seg	D+35	Homologação — Manoel opera 100% por 3 dias consecutivos	Manoel Costa
M4	28/10/2026 · ter	D+45	GO-LIVE — Sistema em produção, Manoel operando, OGMO notificado	Josias (assinatura)

DEMO EXECUTIVA NO D+21 · 05/10/2026

A Diretoria acompanha o sistema funcionando **ao vivo** no meio do cronograma — não espera o fim. Nesse ponto, a Lousa oficial de Suape já está espelhada, o remanejamento digital dispara e-mail formal ao OGMO em menos de 2 minutos, e o PWA do TPA está instalável.

02 · Premissas

O que mudou pra caber em 45 dias

O plano original previa 18 semanas (126 dias) com dedicação parcial de 50-60%. Para a janela de 45 dias, 4 premissas mudam conscientemente — assumindo risco calculado e trade-offs explícitos.

TRADE-OFF CONSCIENTE: ESCOPO REDUZIDO, DEDICAÇÃO INTEGRAL

Para entregar o MVP em 45 dias, **o sponsor técnico (Paulo) dedicará 100% do seu tempo** ao projeto, com Becker/Córtex/Sinapse/FaceGate entrando em modo manutenção. Em paralelo, **cerca de 40% das features** originalmente planejadas vão para a Fase 2 (BI avançado, Recife/EscalaNet, hardening pesado).

As 4 premissas do cronograma de 45 dias

#	PREMISSA	IMPLICAÇÃO
1	100% do tempo do Paulo durante 45 dias	Becker, Córtex, Sinapse e FaceGate entram em modo manutenção com aviso prévio de 2 semanas. Recuperação depois do D+45.
2	Escopo reduzido em ~40%	BI mínimo (4 KPIs), sem hardening pesado, sem load test k6 exaustivo, sem apresentação formal ao MPT no MVP. Tudo vai pra Fase 2.
3	Paralelismo agressivo entre atividades	2-3 frentes em paralelo (back, front, infra) — sempre que possível, sem dependência bloqueante.
4	Homologação curta (3 dias, não 2 semanas)	1 fiscal-piloto (Manoel Costa) usa o sistema em 3 turnos consecutivos. Mais arriscado — se aparecer bug em produção, pega o Josias e Manoel de surpresa.

Gatilhos Go/No-Go (D+11, D+21, D+35)

Para mitigar o risco do prazo curto, definimos **3 checkpoints** com decisões binárias:

CHECKPOINT	O QUE VALIDAMOS	SE NÃO PASSAR
D+11 (M1)	Lousa oficial do OGMO/PE espelhada em tempo real	Reavaliar escopo · se scraping bloqueado, prorrogar 2 semanas
D+21 (M2)	Remanejamento digital + PWA do TPA funcionando	Esticar prazo em 15 dias (D+60) · reduzir escopo Fase 2
D+35 (M3)	Manoel Costa homologando 100% por 3 turnos reais	Esticar prazo em 10 dias (D+55) · 2º fiscal-piloto entra

Recomendações finais

Próximos passos e decisão da Diretoria

Para iniciar a Sprint 0 em 14/09/2026, a Diretoria precisa aprovar o plano e indicar os pontos focais internos do Sindicato.

O que pedimos à Diretoria nesta reunião

- 1. **Aprovação formal do plano de 45 dias** — assinatura do termo de aprovação (última página).
- 2. **Confirmação de Manoel Costa** como fiscal-piloto (ou indicação de substituto) — ele é o usuário-chave do MVP.
- 3. **Indicação de advogado trabalhista** (Cristiano Oliveira, Nathalia Santos ou equivalente) para o parecer LGPD — necessário na Sprint 1.
- 4. **Fornecimento da CCT 2024-2026 vigente** — base para o módulo de remanejamento digital.
- 5. **Reserva da agenda do Paulo 100%** entre 14/09 e 28/10/2026 — Becker/Córtex/Sinapse/FaceGate em modo manutenção.
- 6. **Aprovação do orçamento de R\$ 2.805** (modelo Patrocínio: Sindicato paga infra + viagem + jurídico; Suporte Gerencial investe as 256h técnicas).

Cronograma de aprovação

DATA	AÇÃO	RESPONSÁVEL
02/09	Envio deste documento à Diretoria	Paulo
até 09/09	Indicação de Manoel Costa + advogado + CCT	Josias + Diretoria
10/09	Aprovação formal e assinatura do termo	Josias
14/09	Kickoff Sprint 0 — início do projeto	Todos

RECOMENDAÇÃO FINAL

45 dias é viável, mas **apertado**. Recomendamos à Diretoria aprovar o cronograma **com colchão de 7 a 10 dias** (D+45 a D+55) para imprevistos. Caso a janela de 45 dias precise ser cumprida a todo custo, o trade-off adicional será cortar mais features de BI/auditoria e adiar o PWA do TPA para a Fase 2.

PRÓXIMO DOCUMENTO: TERMO DE APROVAÇÃO FORMAL

Para formalizar a aprovação, o documento **SINDESTIVA-PE-PLANO-IMPLEMENTACAO-2026-09-01.md** (16 seções, 67KB) contém o termo de aprovação completo, com espaço para assinaturas do Presidente, do Sponsor técnico e do Fiscal-chave. Será enviado em conjunto com este cronograma.

03 · Marcos

Datas fixas e entregas formais

Cinco marcos com datas e entregáveis imutáveis. O M2 (05/10) é o ponto de controle da Diretoria — onde o sistema é apresentado ao vivo, com dados reais do Porto de Suape.

Linha do tempo visual




Detalhamento dos marcos

MARCO	DATA	ENTREGÁVEL
M0	18/09 · D+4	Setup e alinhamento. Kickoff com Josias e Manoel · CCT obtida · advogado contratado · VPS provisionado · repo criado · carta formal ao OGMO/PE enviada.
M1	25/09 · D+11	Centro de Comando com Lousa oficial espelhada. Scraper TPA rodando a cada 60s · dados de Suape em tempo real · Manoel valida ao vivo.
M2 ★	05/10 · D+21	Demo executiva com a Diretoria. Sistema completo: Lousa + remanejamento (e-mail OGMO < 2 min) + PWA do TPA + auditoria com hash chain. 5 TPAs-piloto demonstram o app.
M3	19/10 · D+35	Homologação Manoel Costa. 3 turnos consecutivos 100% no sistema · NPS ≥ 7 · bugs P0 zerados.
M4	28/10 · D+45	GO-LIVE. Produção aberta · Manoel operando · OGMO notificado · Josias assina termo de aceite · monitoramento 24/7 ativo.

04 · Visão Gantt

7 sprints semanais · 45 dias

Diagrama de Gantt com as 12 macro-atividades distribuídas ao longo dos 7 sprints. Barras coloridas indicam a janela de execução de cada frente; círculos numerados marcam os 5 marcos do projeto.

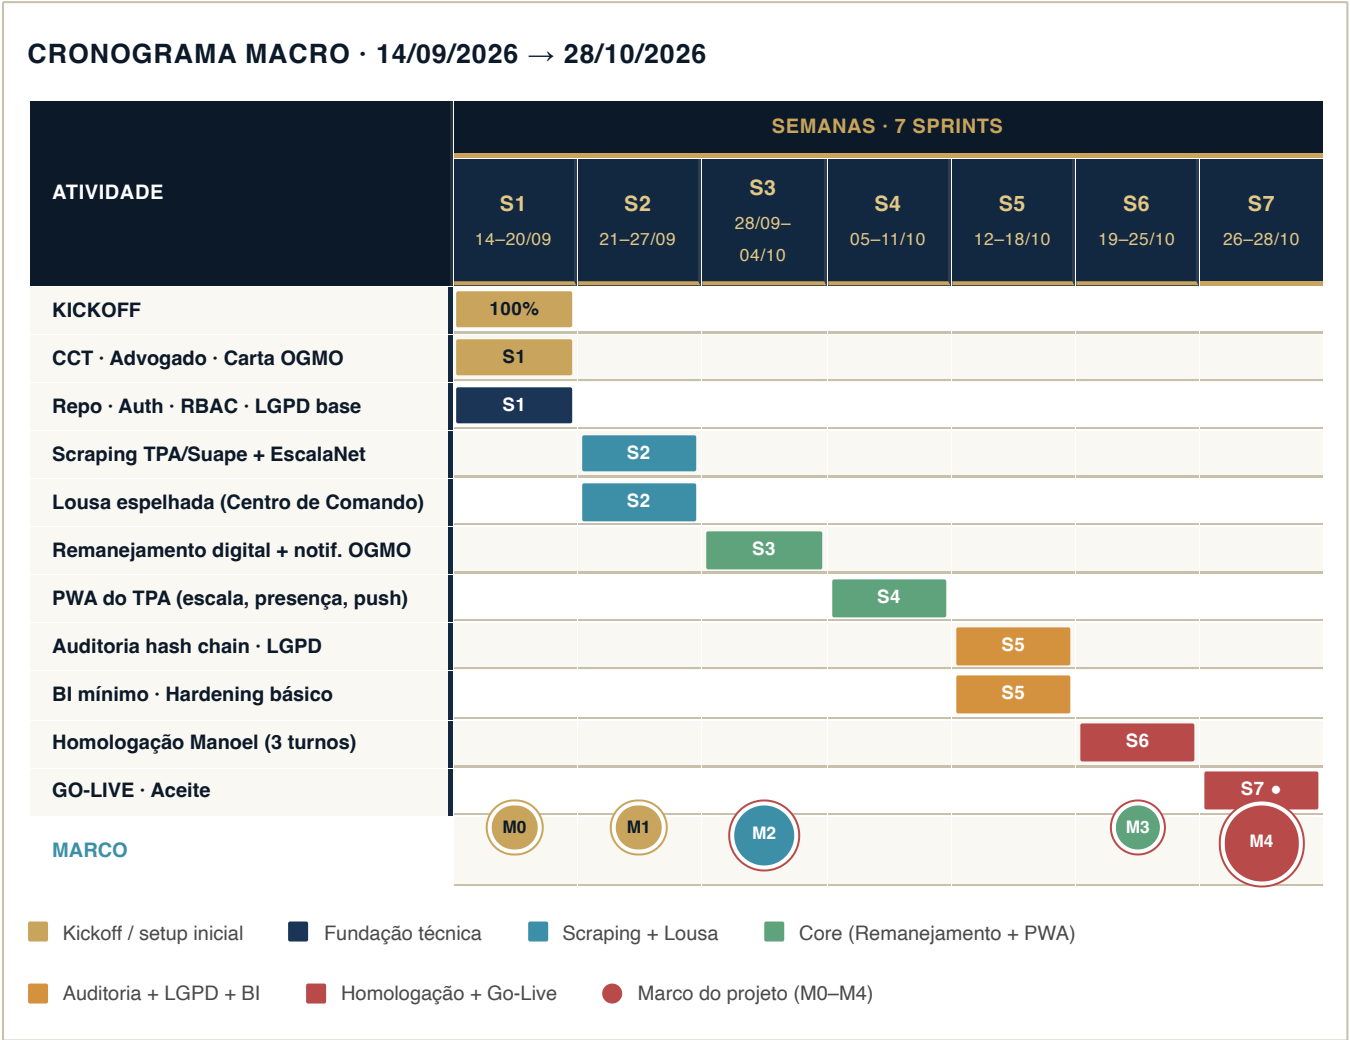

Como ler o diagrama

- **Eixo vertical:** 12 macro-atividades do projeto, agrupadas por sprint temática.
- **Eixo horizontal:** 7 sprints semanais (S1 a S7), com datas no cabeçalho.
- **Barras coloridas:** janela de execução de cada atividade (cor indica a frente de trabalho).
- **Círculos numerados (M0–M4):** marcos formais. **M2** = demo executiva · **M4** = GO-LIVE.

ATIVIDADES PARALELAS

O cronograma aproveita paralelismo sempre que possível. Em S3, a Lousa do Centro de Comando (S2) já está rodando com dados reais **enquanto** o remanejamento digital é construído — valor incremental a cada semana, sem bloquear o sponsor técnico.
